

Техническая спецификация

На изготовление, доставку и сборку мобильного офиса из МПК (МПИ)

г. Алматы.

№	Наименование работ	Характеристика	Кол-во, объем
1	Изготовить Доставить Собрать МПИ из 4х стен и потолка	Стена №1 – 2700 мм*2500 мм, верх - с остеклением, низ- глухой, сендвичпанель с утеплителем. Окно – 2000мм*1100 мм. (стеклопакет) со сложным открыванием и москитной сеткой Цвет МПИ – белый.	Одна единица (конструкции)
2		Стена №2- 2500 мм*2500 мм, верх - с остеклением, низ- глухой, сендвичпанель с утеплителем. Окно – 1000мм*1100 мм. (стеклопакет) со сложным открыванием и москитной сеткой Цвет МПИ – белый.	
3		Стена №3 – 2700 мм*2500 мм, сендвичпанель с утеплителем. Цвет МПИ – белый.	
4		Стена №4 – 2500 мм*2500 мм, верх - с остеклением, низ- глухой, сендвичпанель. Окно – 1000 мм*1100 мм. (стеклопакет) Дверь металлическая – 2,05 м*0,75 м, правое открывание наружу с замком и ручкой. Цвет МПИ – белый	
5		Каркас рамы пола швеллер №14 с поперечными балками из С-образных гнутых профилей не менее (120ммХ72мм) и деревянная обрешетка брус не менее (100мм Х 45мм) Каркас рамы потолка швеллер №12 с поперечными балками из С-образных гнутых профилей не менее (120ммХ72мм) и деревянная обрешетка брус не менее (100мм Х 45мм) Каркас стен стальная конструкция из С-образных гнутых профилей не менее (120ммХ72мм)	
6		1)Потолок – перекрытие. 2700 мм х 2500 мм Плоское с усилением от прогиба, сендвичпанель с утеплением 2)Пол Фанера толщина 22мм настил из коммерческого покрытия (линолеум), плинтуса. Дно стальной оцинкованный профилированный не менее Т 0,7 мм (с утеплением	

7		Розетка двойная: 3 шт в разных углах по паре (указано на схеме) Выключатели: 1 шт парный (наружный и внутренний) Освещение: светильники 2шт внутренний, 1шт наружный Проводку провести медным кабелем в металлорукаве ВГГ-2.5х3 розетки ВГГ-1.5х3 освещение Распределительный щиток с автоматическими выключателями внутри помещения	
8		Кондиционер зима-лето 1200W с установкой на стене 3, как указано на схеме.	
9		Установка колес 9шт (колеса должны входить в комплект мобильного офиса) 3 ряда по 3 колеса. Толщина металла стойки колеса 5мм	
10		Гарантия не менее 12 месяцев с момента установки	
11	Предусмотреть расходный и крепежный материал, детали усиления конструкции		

Дополнительные требования:

- Предусмотреть пропускной режим (в случае потребности сборки на месте)
- Материал поставщика работ и услуг, предусмотреть доставку Товара
- Все используемые материалы должны соответствовать ГОСТ, СНИП, ПТЭ, ПТБ и другим нормативным документам и требованиям РК
- **При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех.задании**
- Предусмотреть расходные материалы
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям охраны труда, ПТЭ, ПТБ, ПУЭ и пожарной безопасности.
- Срок изготовления товара не более 15 рабочих дней с момента подписания договора.

Ценовое предложение должно содержать следующее:


- 1) техническую спецификацию;
- 2) фото подобных изделий внутри снаружи

Координатор по ПОО ВС

Муслихин. Д

И.О Менеджер по наземному техническому обслуживанию

Авдеев. М

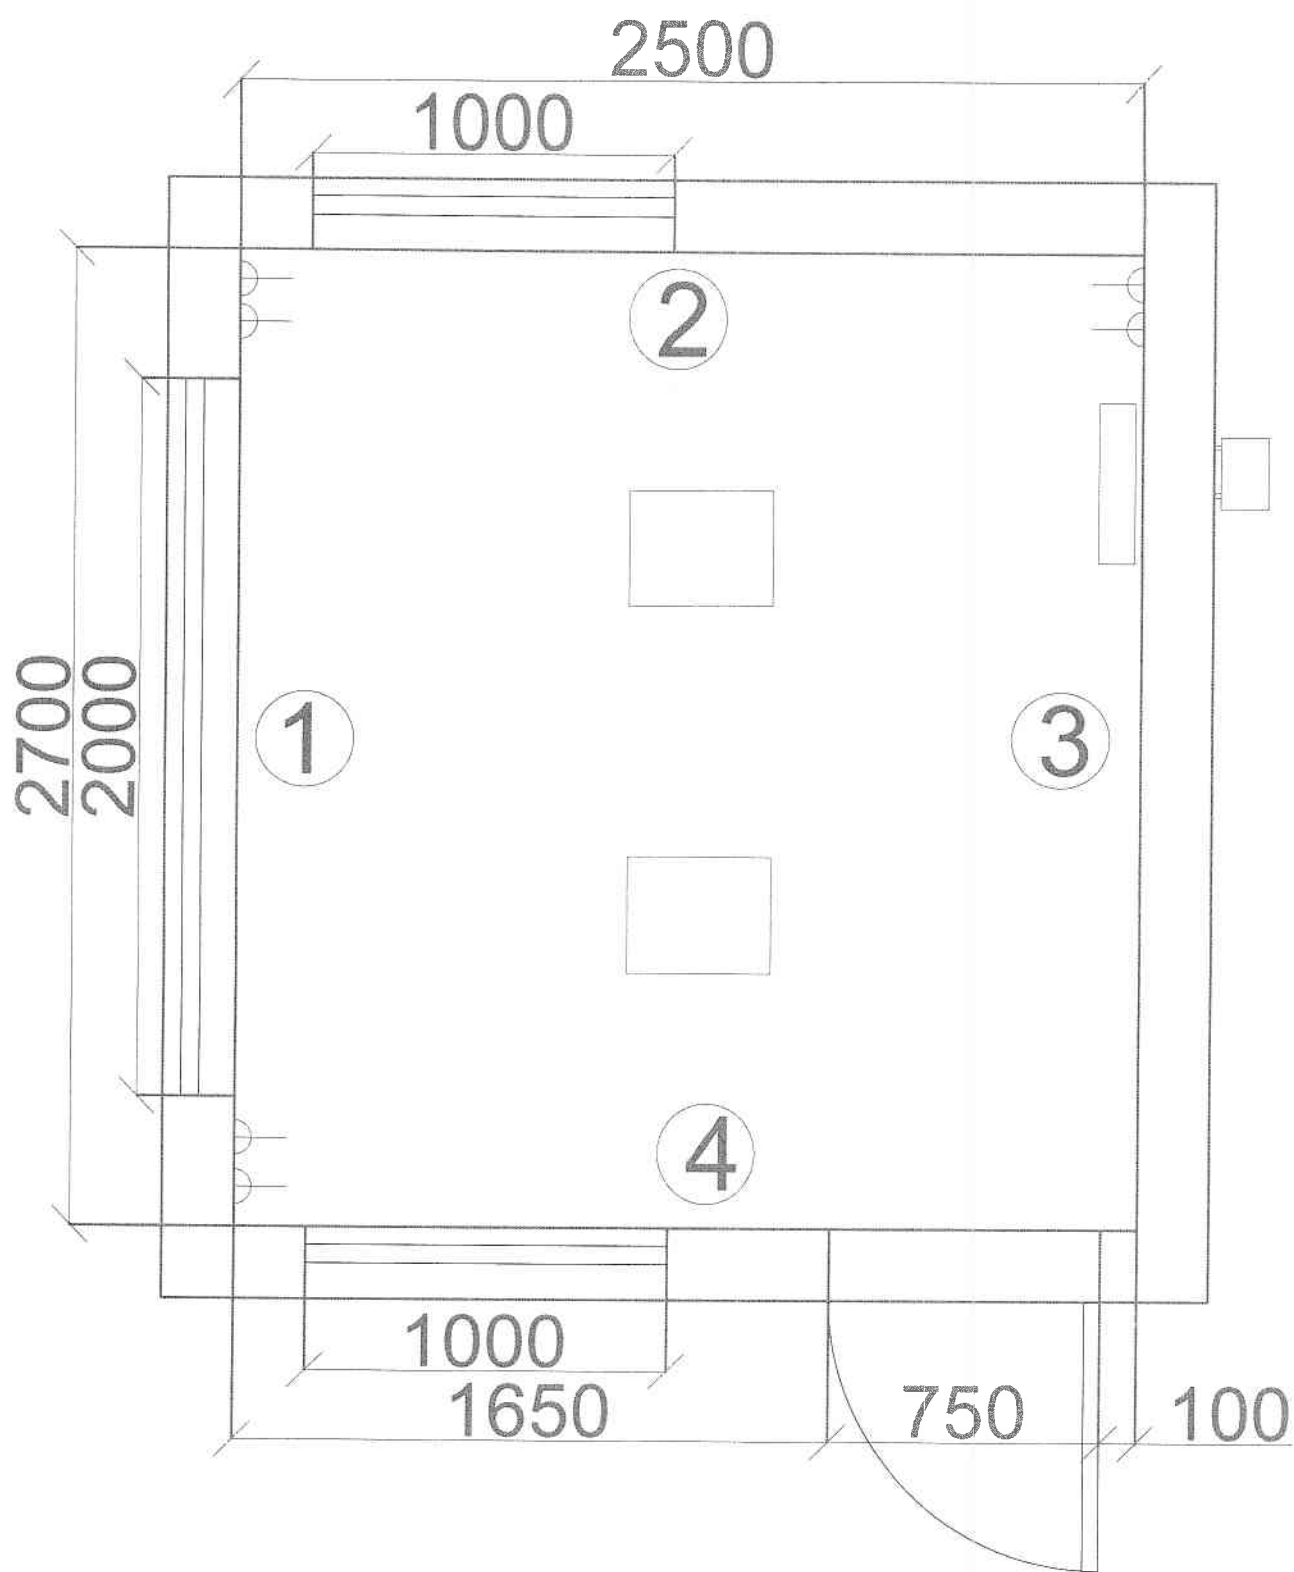

эл. розетка 220 В



№ стены



кондиционер 1200W



светильник
